Anlage 11.2

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**SWU Verkehr**			
2	**Reaktivierung Staudenbahn**	**404 Tage?**	**Mit 01.10.25**	**Mon 19.04.27**
3	**Meisteinterminplan Bauzeiten**			
4				
5	**Ausgleichsmaßnahmen (Phase 1 vor Baumaßnahme)**	**261 Tage?**	**Mit 01.10.25**	**Mit 30.09.26**
6	Biotope Umsiedlungshabitate herstellen	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26
7	mit Umzäunung			
8				
9	**Haselmaus**			
10	Eingriff in Begleithölze	109 Tage	Don 01.10.26	Die 02.03.27
11	Rodung Wurzelstöcke Begleithölze	36 Tage	Mon 01.03.27	Mon 19.04.27
12				
13	**Fledermaus**			
14	Bäume absuchen nach Fledermaushöhlen			
15	Gebäudeabbruch Bahnhofgebäude Fischach	32 Tage	Mon 02.11.26	Die 15.12.26
16	Gebäudeabbruch Bahnhofgebäude Langenneufnach	32 Tage	Mon 02.11.26	Die 15.12.26
17				
18	**Zaun-/Mauer-/Waldeidechse**			
19	Verkrämung	65 Tage	Mon 24.08.26	Fre 20.11.26
20				
21	**Vögel**			
22	Flächen roden und räumen	105 Tage	Don 01.10.26	Mit 24.02.27
23				
24	**Baubeginn**		Mon 15.03.27	
25				
26	**Baustelleneinrichtungsflächen herstellen/betreiben (Phase 2 Bauarbeiten)**	**452 Tage**	**Mon 15.03.27**	**Mon 04.12.28**
27	**Be-Fläche 1 Gessertshausen herstellen**	19 Tage	Mon 15.03.27	Don 08.04.27
28	Mat-Lagerung und Abholung	275 Tage	Mit 14.04.27	Mon 01.05.28
29	Schotterzwischenlagerung	99 Tage	Mit 04.08.27	Fre 17.12.27
30	**Be-Fläche 2 Margertshausen herstellen**	19 Tage	Mon 15.03.27	Don 08.04.27
31	Mat-Lagerung und Abholung	275 Tage	Mit 14.04.27	Mon 01.05.28
32	Schotterzwischenlagerung	100 Tage	Mit 04.08.27	Mon 20.12.27
33	**Be-Fläche 3 Holzverladeplatz**	15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
34	Mat-Lagerung und Abholung	275 Tage	Mon 05.04.27	Don 20.04.28
35	Schotterzwischenlagerung	160 Tage	Mon 26.07.27	Don 02.03.28
36	**Be-Fläche 4 Nördl. Fischach herstellen**	30 Tage	Mon 15.03.27	Fre 23.04.27
37	Mat-Lagerung und Abholung	275 Tage	Mon 26.04.27	Don 11.05.28
38	Gleisschotterantransport und auf Halde planieren	90 Tage	Mon 02.08.27	Fre 03.12.27
39	Gleisschotterabsiebung	95 Tage	Mon 02.08.27	Fre 10.12.27
40	Schotterzwischenlagerung	160 Tage	Mon 02.08.27	Don 09.03.28
41	**Be-Fläche 5 Schloß Innischwang herstellen**	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27
42	Mat-Lagerung und Abholung	275 Tage	Mit 14.04.27	Mon 01.05.28
43	Schotterzwischenlagerung	55 Tage	Mit 27.10.27	Mon 10.01.28
44	**Be-Fläche 6 Bf Langenneufnach herstellen**	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27
45	Mat-Lagerung und Abholung	281 Tage	Mit 14.04.27	Die 09.05.28
46	Schotterzwischenlagerung	81 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28
47	**Be-Flächen rückbauen**	16 Tage	Mon 13.11.28	Mon 04.12.28
48				
49	**Feldwege herstellen**	**431 Tage**	**Mon 12.04.27**	**Fre 01.12.28**
50	Oberboden abtragen	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
51	ggf. Bodenstabilisierung	15 Tage	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27
52	Mineralische Tragschicht herstellen	10 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27
53	Oberfläche für Übergabezustand herstellen	15 Tage	Mon 13.11.28	Fre 01.12.28
54				
55	**Gründungen Oberleitung herstellen**	**338 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Die 15.02.28**
56	Abstecken der Gründungen (265 Stck)	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26
57	Nachuntersuchung durch Baugrundgutachter	25 Tage	Mon 09.11.26	Fre 11.12.26
58	Statische Berechnung der Rammfundamente	35 Tage	Mon 14.12.26	Fre 29.01.27
59	Bauabschnitt 1 (10 Stück)	4 Tage	Mit 23.06.27	Mon 28.06.27
60	Bauabschnitt 2 (26 Stück)	8 Tage	Fre 11.06.27	Die 22.06.27
61	Bauabschnitt 3 (Margertshausen 20 Stück)	8 Tage	Die 01.06.27	Don 10.06.27
62	Bauabschnitt 4.1 (11 Stück)	4 Tage	Mit 26.05.27	Mon 31.05.27
63	Bauabschnitt 4.2 (BBh Reitenbuch 16 Stück)	5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27
64	Bauabschnitt 4.4 (32 Stück)	12 Tage	Mon 10.05.27	Die 25.05.27
65	Bauabschnitt 5.1 (Fischach Nord 7 Stück)	5 Tage	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27
66	Bauabschnitt 5.2 (Bf Fischach 10 Stück)	5 Tage	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27
67	Bauabschnitt 5.3 (Fischach Süd 12 Stück)	5 Tage	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27
68	Bauabschnitte 6.1 bis 6.3 (65 Stück)	20 Tage	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27
69	Bauabschnitt 7.1 und 7.2 (17 Stück)	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27
70	Bauabschnitt 7.3 (Bf Langenneufnach 12 Stück)	5 Tage	Mit 09.02.28	Die 15.02.28
71	Bauabschnitt 7.3 (Südlich Haltestelle 12 Stück)	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27
72				
73	**Schienen- u. Weichenlieferung**	**553 Tage**	**Mon 03.11.25**	**Die 14.12.27**
74	Schienenteilungsplan	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
75	B300 Straßensperrung	2 Tage	Mon 02.08.27	Die 03.08.27
76	Baubschnitte 1 bis 4.1 (je Zug 4.000 m Schienen)	50 Tage	Mon 02.08.27	Fre 08.10.27
77	Baubschnitt 4.2 (BBh Reitenbuch)	15 Tage	Mon 11.10.27	Fre 29.10.27
78	Weichenlieferung 4.2 (BBh Reitenbuch)	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
79	Baubschnitte 4.3 und 5.2	33 Tage	Mon 01.11.27	Die 14.12.27
80	Weichenlieferung 5.2 (Bf Fischach)	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
81	Baubschnitte 5.4 bis 7.3 (ca. 11.500 m Schienen)	3 Tage	Mon 03.11.25	Mit 05.11.25
82	Weichenlieferung 7.3 (Bf Langenneufnach)	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27
83				
84	**BA 1 Gessertshausen km 0+820 - 1+450 (ca. 600 m)**	**218 Tage**	**Mon 21.06.27**	**Die 18.04.28**
85	B300 Straßensperrung 1 -Sommerferien 2027- 2 Schichten	12 Tage	Mon 02.08.27	Die 17.08.27
86	Bü-Bereich Rückbau Asphalt, Gleis inkl. Schotter/Gleis	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27
87	BÜ-Bereich Gleisstopfung	1 Tag	Fre 13.08.27	Fre 13.08.27
88	Planie+Asphalt und Übergangseinbau	2 Tage	Fre 13.08.27	Mon 16.08.27
89	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	5 Tage	**Mon 21.06.27**	**Fre 25.06.27**
90	Vorbereitungsarbeiten	10 Tage	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27
91	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	15 Tage	Mon 12.07.27	Fre 30.07.27
92	Gleisschottereinbau	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27
93	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	10 Tage	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27
94	Gleisbau beidseitig vom Übergang	15 Tage	Mon 02.08.27	Die 24.08.27
95	Kabeltiefbau	15 Tage	Mit 25.08.27	Die 14.09.27
96	B300 Straßensperrung 2 -Osterferien 2028- 2 Schichten	7 Tage	Mon 10.04.28	Die 18.04.28
97	Asphaltausbau und Einbau			
98	Gleisstopfung+Gleisvermessung+Walzhautschliff			
99		1 Tag?	Mon 03.11.25	Mon 03.11.25
100	**BA 2 freie Strecke km 1+450 - 2+890 (1.440 m)**	**145 Tage**	**Mon 05.04.27**	**Fre 22.10.27**
101	Wichtigste Bauabschnitt wg allen anschließended BA			
102	Baubeginn sofort nach Auftrag mit 2 Kolonnen			
103	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27
104	Rückbau Gleis inkl. Schotter	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27
105	Fräs-Misch-Injektions-Verfahren (FMI) (Schlüsselgewerk)	20 Tage	Mon 05.07.27	Fre 30.07.27
106	Durchlasserneuerung	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27
107	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	5 Tage	Mon 16.08.27	Fre 20.08.27
108	Gleisschottereinbau	5 Tage	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27
109	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	15 Tage	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27
110	Kabeltiefbau	25 Tage	Mon 20.09.27	Fre 22.10.27
111				
112	**BA 3 Margertshausen km 2+890 - 3+920 (ca. 1000 m)**	**175 Tage?**	**Mon 26.04.27**	**Don 23.12.27**
113	Baufeld freimachen	15 Tage	**Mon 26.04.27**	**Fre 14.05.27**
114	Rückbau Gleis inkl. Schotter	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27
115	Aushub Bahnsteig	5 Tage	**Mon 12.07.27**	**Fre 16.07.27**
116	Kabeltiefbau 1 -Querungen-	3 Tage	Mon 12.07.27	Mit 14.07.27
117	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	12 Tage	Don 15.07.27	Fre 30.07.27
118	Bahnsteigkanten-Fundament setzen	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27
119	Kabeltiefbau 2 Längsleitungen	15 Tage	Mon 09.08.27	Fre 27.08.27
120	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundam. 2 Stck	20 Tage	**Mon 09.08.27**	**Fre 03.09.27**
121	Fahrbahn Asphalteinbau	3 Tage	Mon 06.09.27	Mit 08.09.27
122	Gleisschottereinbau	10 Tage	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27
123	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	5 Tage	Mon 20.09.27	Fre 24.09.27
124	Bahnsteigkanten setzen	5 Tage	Mon 27.09.27	Fre 01.10.27
125	Haltestellenausbau	35 Tage?	Mon 04.10.27	Fre 19.11.27
126	Fahrbahn Erdarbeiten	30 Tage	Mon 04.10.27	Fre 12.11.27
127	Fahrbahn Pflasterarbeiten + Entwässerung	20 Tage	Mon 15.11.27	Fre 10.12.27
128	Fahrbahn Asphalteinbau	10 Tage?	Son 12.12.27	Don 23.12.27
129				
130	**BA 4.1 freie Strecke km 3+420 - 4+450 (ca. 1.000 m)**	**130 Tage**	**Mon 17.05.27**	**Fre 12.11.27**
131	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27

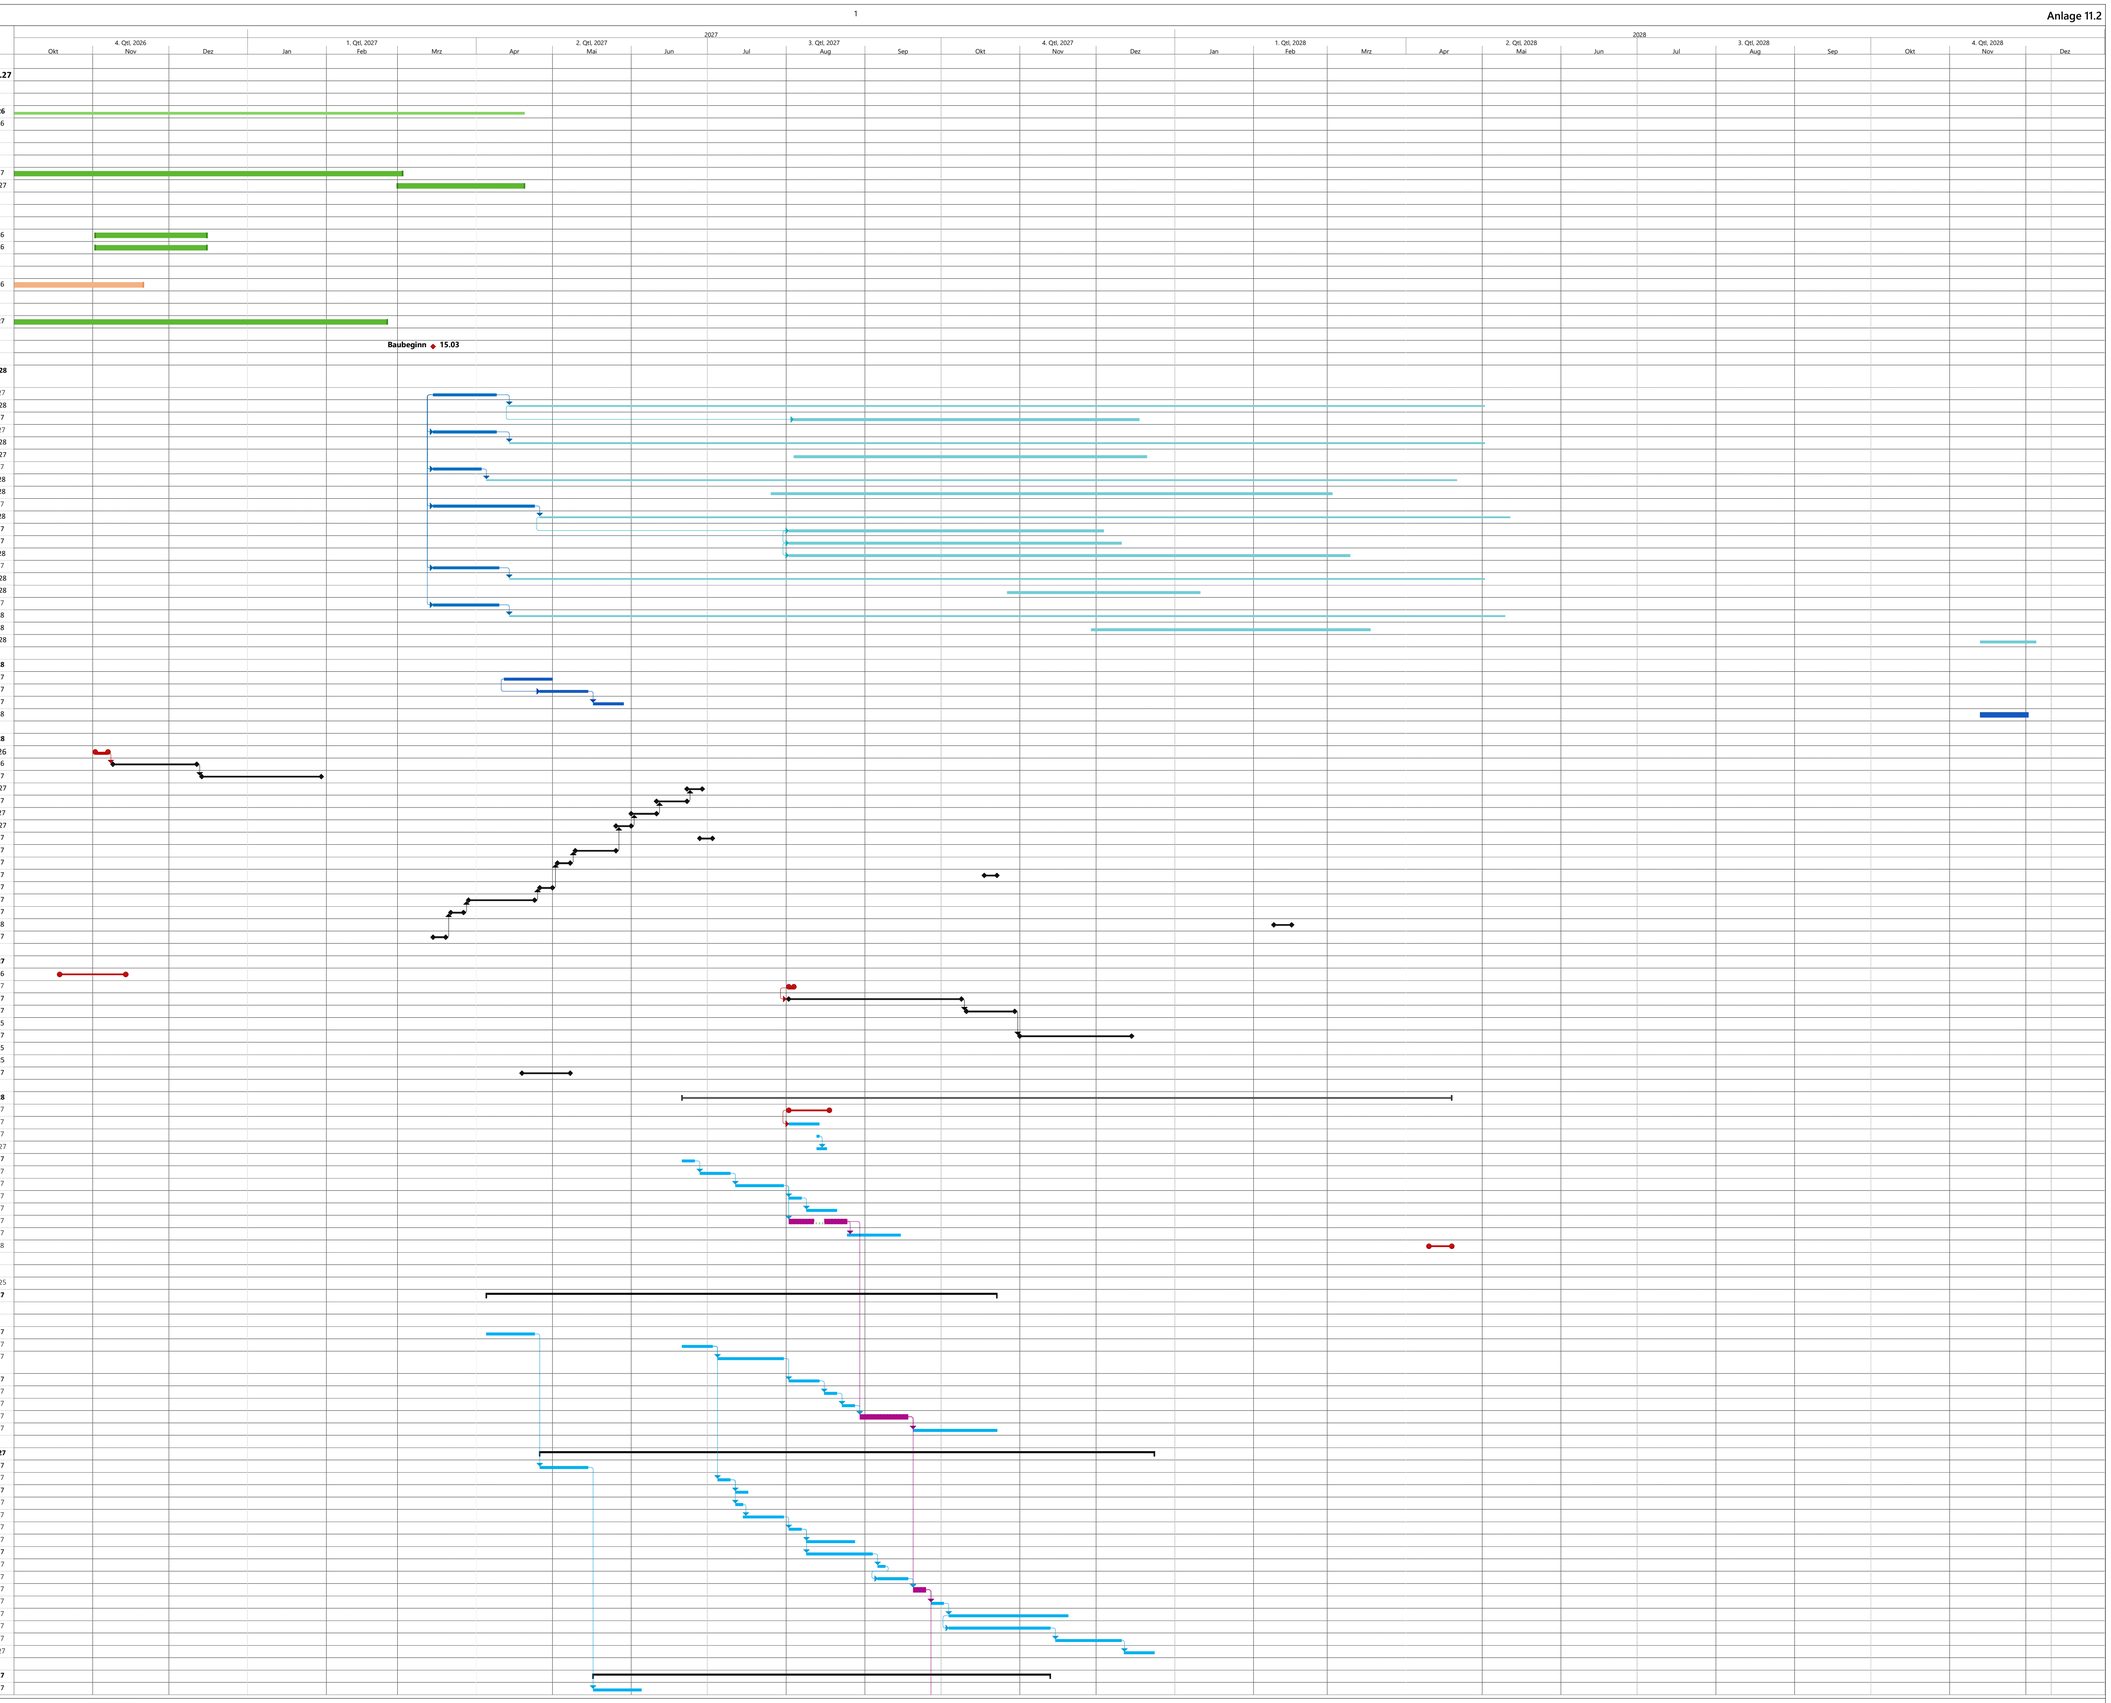

Projekt: 241127 Bauzeitenplan
Datum: Mon 28.07.25

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | Geplant | Geplanter Meilenstein | Geplanter Sammelvorgang | In Arbeit | Manueller Fortschritt

Anlage 11.2

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
132	Rückbau Gleis inkl. Schotter	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27
133	Durchlasserneuerung	15 Tage	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27
134	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundamente	15 Tage	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27
135	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	15 Tage	Mon 16.08.27	Fre 03.09.27
136	Gleisschottereinbau	10 Tage	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27
137	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	10 Tage	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27
138	Fahrbahn prov. Asphalteinbau	5 Tage	Mon 11.10.27	Fre 15.10.27
139	Kabeltiefbau	25 Tage	Mon 11.10.27	Fre 12.11.27
140				
141	**BA 4.2 BBh Reitenbuch km 4+450 - 5+380 (ca. 900 m)**	**233 Tage**	**Mon 03.05.27**	**Die 21.03.28**
142	Wurzelstöcke roden	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27
143	Rückbau Gleis inkl. Schotter	5 Tage	Mon 17.05.27	Fre 21.05.27
144	Aushubarbeiten	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
145	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27
146	Gründung für Oberleitungsmaste	5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27
147	Tiefenentwässerung	20 Tage	Mon 05.07.27	Fre 30.07.27
148	Kabeltiefbau	25 Tage	Mon 02.08.27	Fre 03.09.27
149	Gleisschottereinbau	10 Tage	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27
150	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	13 Tage	Mon 11.10.27	Mit 27.10.27
151	Weicheneinbau	15 Tage	Don 28.10.27	Mit 17.11.27
152	Wegebau	20 Tage	Don 18.11.27	Die 14.12.27
153	Einfriedung	12 Tage	Mon 06.03.28	Die 21.03.28
154				
155	**BA 4.3 BW Adelbach km 5+390**	**55 Tage**	**Mon 28.06.27**	**Fre 10.09.27**
156	Einbau Stahldurchlassrohr	5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27
157	Abbruch Bauwerk mit Erdarbeiten	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27
158	Herstellen Gründung	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27
159	Einheben Stahlbeton-Fertigteil	1 Tag	Mon 26.07.27	Mon 26.07.27
160	Betonarbeiten	15 Tage	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27
161	Abdichtungsarbeiten	10 Tage	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27
162	Erdarbeiten mit Rückbau Durchlassrohr	10 Tage	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27
163				
164	**BA 4.4 freie Strecke km 5+380 - 7+100 (ca. 1.700 m)**	**224 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Mit 15.03.28**
165	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
166	Rückbau Gleis inkl. Schotter	25 Tage	Mon 24.05.27	Fre 25.06.27
167	Durchlasserneuerung	20 Tage	Mon 28.06.27	Fre 23.07.27
168	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
169	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundamente	15 Tage	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27
170	Fahrbahn prov. Asphalteinbau	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27
171	Gleisschottereinbau	15 Tage	Mon 20.09.27	Fre 08.10.27
172	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	20 Tage	Don 28.10.27	Mit 24.11.27
173	Kabeltiefbau	35 Tage	Don 25.11.27	Mit 15.03.28
174				
175	**BA 5.1 Fischach Nord km 7+100 - 7+620 (ca. 500 m)**	**221 Tage?**	**Mon 28.06.27**	**Fre 28.04.28**
176	Rückbau Gleis inkl. Schotter	10 Tage	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27
177	Aushub Bahnsteig	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27
178	Durchlasserneuerung	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
179	Kabeltiefbau -Querungen-	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27
180	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundamente	10 Tage	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27
181	Fahrbahn Asphalteinbau	5 Tage	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27
182	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	15 Tage	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27
183	Bahnsteigkanten-Fundament setzen	5 Tage	Mon 20.09.27	Fre 24.09.27
184	Gleisschottereinbau	15 Tage	Mon 27.09.27	Fre 15.10.27
185	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	15 Tage	Don 25.11.27	Die 14.12.27
186	Bahnsteigkanten setzen	5 Tage	Mon 21.02.28	Fre 25.02.28
187	Haltestellenausbau	45 Tage?	Mon 28.02.28	Fre 28.04.28
188				
189	**BA 5.2 Fischach Bf km 7+620 - 8+165 (ca. 500 m)**	**301 Tage?**	**Mon 26.04.27**	**Fre 16.06.28**
190	Baufeld freimachen	5 Tage	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27
191	Erschließungswege herstellen	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27
192	Rückbau Gleis inkl. Schotter	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27
193	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundam. 1 Stck	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27
194	Fahrbahn prov. Asphalteinbau	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27
195	Aushub Bahnsteig	15 Tage	Mon 12.07.27	Fre 30.07.27
196	Kanalbau	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27
197	Durchlassbauwerke herstellen	15 Tage	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27
198	Winkelstützwand herstellen	10 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27
199	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	15 Tage	Mon 27.09.27	Fre 15.10.27
200	Gründung für Oberleitungsmaste	5 Tage	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27
201	Kabeltiefbau	15 Tage	Mon 25.10.27	Fre 12.11.27
202	Bahnsteigkanten-Fundament setzen	10 Tage	Mon 15.11.27	Fre 26.11.27
203	Gleisschottereinbau	5 Tage	Mon 29.11.27	Fre 03.12.27
204	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	10 Tage	Mit 15.12.27	Die 28.12.27
205	Weicheneinbau	5 Tage	Mit 29.12.27	Die 04.01.28
206	Bahnsteigkanten setzen	10 Tage	Mon 28.02.28	Fre 10.03.28
207	Haltestellenausbau	35 Tage?	Mon 13.03.28	Fre 28.04.28
208	Fahrbahn Erdarbeiten	10 Tage?	Mon 01.05.28	Fre 12.05.28
209	Fahrbahn Pflasterarbeiten + Entwässerung	15 Tage?	Mon 15.05.28	Fre 02.06.28
210	Fahrbahn Asphalteinbau	10 Tage?	Mon 05.06.28	Fre 16.06.28
211				
212	**BA 5.3 Schmutterbrücke km 8+165**	**222 Tage?**	**Mon 03.05.27**	**Mon 06.03.28**
213	Brückenüberbau ausheben mit Gleisrückbau	5 Tage	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27
214	Brückenabbruch mit Gleisrückbau	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27
215	Fundamentabbruch	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27
216	Spundwandverbau	2 Tage	Mon 17.05.27	Die 18.05.27
217	Gründung mit Bohrpfähle herstellen	10 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27
218	Aushub Fundamentgründung	10 Tage	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27
219	Schal und Bewehrungsarbeiten	100 Tage	Mon 14.06.27	Fre 29.10.27
220	Betonfundament und Widerlager mit Flügelwände	85 Tage	Mon 14.06.27	Fre 08.10.27
221	Baugrubenverfüllung	10 Tage	Mon 11.10.27	Fre 22.10.27
222	Überbau einbauen	10 Tage	Mon 25.10.27	Fre 05.11.27
223	Zusatzarbeiten, Belege, Geländer, Gleisvorbereitungen	50 Tage?	Mon 08.11.27	Mon 06.03.28
224				
225	**BA 5.4 Fischach Süd km 8+165 - 8+800 (ca. 650m)**	**206 Tage**	**Mon 03.05.27**	**Fre 11.02.28**
226	Rückbau Gleis inkl. Schotter	5 Tage	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27
227	**Leitungsumlegungen**	30 Tage	Mon 10.05.27	Fre 18.06.27
228	**Kanalbau**	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27
229	Winkelstützwand herstellen	25 Tage	Mon 19.07.27	Fre 20.08.27
230	Ausbau Bahnübergang Kreisstr., Kabeltiefbau+Fundamente	20 Tage	Mon 23.08.27	Fre 17.09.27
231	Fahrbahn prov. Asphalteinbau	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27
232	Kabeltiefbau	15 Tage	Mon 20.09.27	Fre 08.10.27
233	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	10 Tage	Mon 11.10.27	Fre 22.10.27
234	Ausbau Bahnübergang, Staatsstr., Kabeltiefbau+Fundamente	20 Tage	Mon 25.10.27	Fre 19.11.27
235	Fahrbahn Asphalteinbau	5 Tage	Mon 22.11.27	Fre 26.11.27
236	Gleisschottereinbau	5 Tage	Mon 29.11.27	Fre 03.12.27
237	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	10 Tage	Mon 31.01.28	Fre 11.02.28
238				
239	**BA 6.1 freie Strecke km 8+800 - 9+760 (ca. 1.000 m)**	**226 Tage**	**Mon 26.04.27**	**Fre 03.03.28**
240	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	15 Tage	Mon 26.04.27	Fre 14.05.27
241	Rückbau Gleis inkl. Schotter	15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27
242	Durchlasserneuerung	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27
243	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundamente ???	15 Tage	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27
244	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	10 Tage	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27
245	Gleisschottereinbau	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27
246	Kabeltiefbau	30 Tage	Mon 06.09.27	Fre 15.10.27
247	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	15 Tage	Mon 14.02.28	Fre 03.03.28
248				
249	**BA 6.2 Neufnachbrücke km 9+760**	**240 Tage**	**Mon 12.04.27**	**Don 09.03.28**
250	Herstellen Mobiler Baustellenzufahrt	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
251	Vorbereitung Brückenaushub und Abbruch	5 Tage	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27
252	Brückenüberbau ausheben mit Gleisrückbau	5 Tage	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27
253	Brückenabbruch mit Gleisrückbau	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
254	Fundamentabbruch	5 Tage	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27
255	Spundwandverbau	5 Tage	Mon 31.05.27	Fre 04.06.27
256	Gründung mit Bohrpfähle herstellen	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27
257	Aushub Fundamentgründung	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27
258	Schal und Bewehrungsarbeiten	80 Tage	Mon 28.06.27	Fre 15.10.27
259	Betonfundament und Widerlager mit Flügelwände	80 Tage	Mon 28.06.27	Fre 15.10.27
260	Baugrubenverfüllung	10 Tage	Mon 18.10.27	Fre 29.10.27
261	Überbau einbauen	5 Tage	Mon 01.11.27	Fre 05.11.27
262	Zusatzarbeiten, Belege, Geländer, Gleisvorbereitungen	60 Tage	Mon 08.11.27	Don 09.03.28

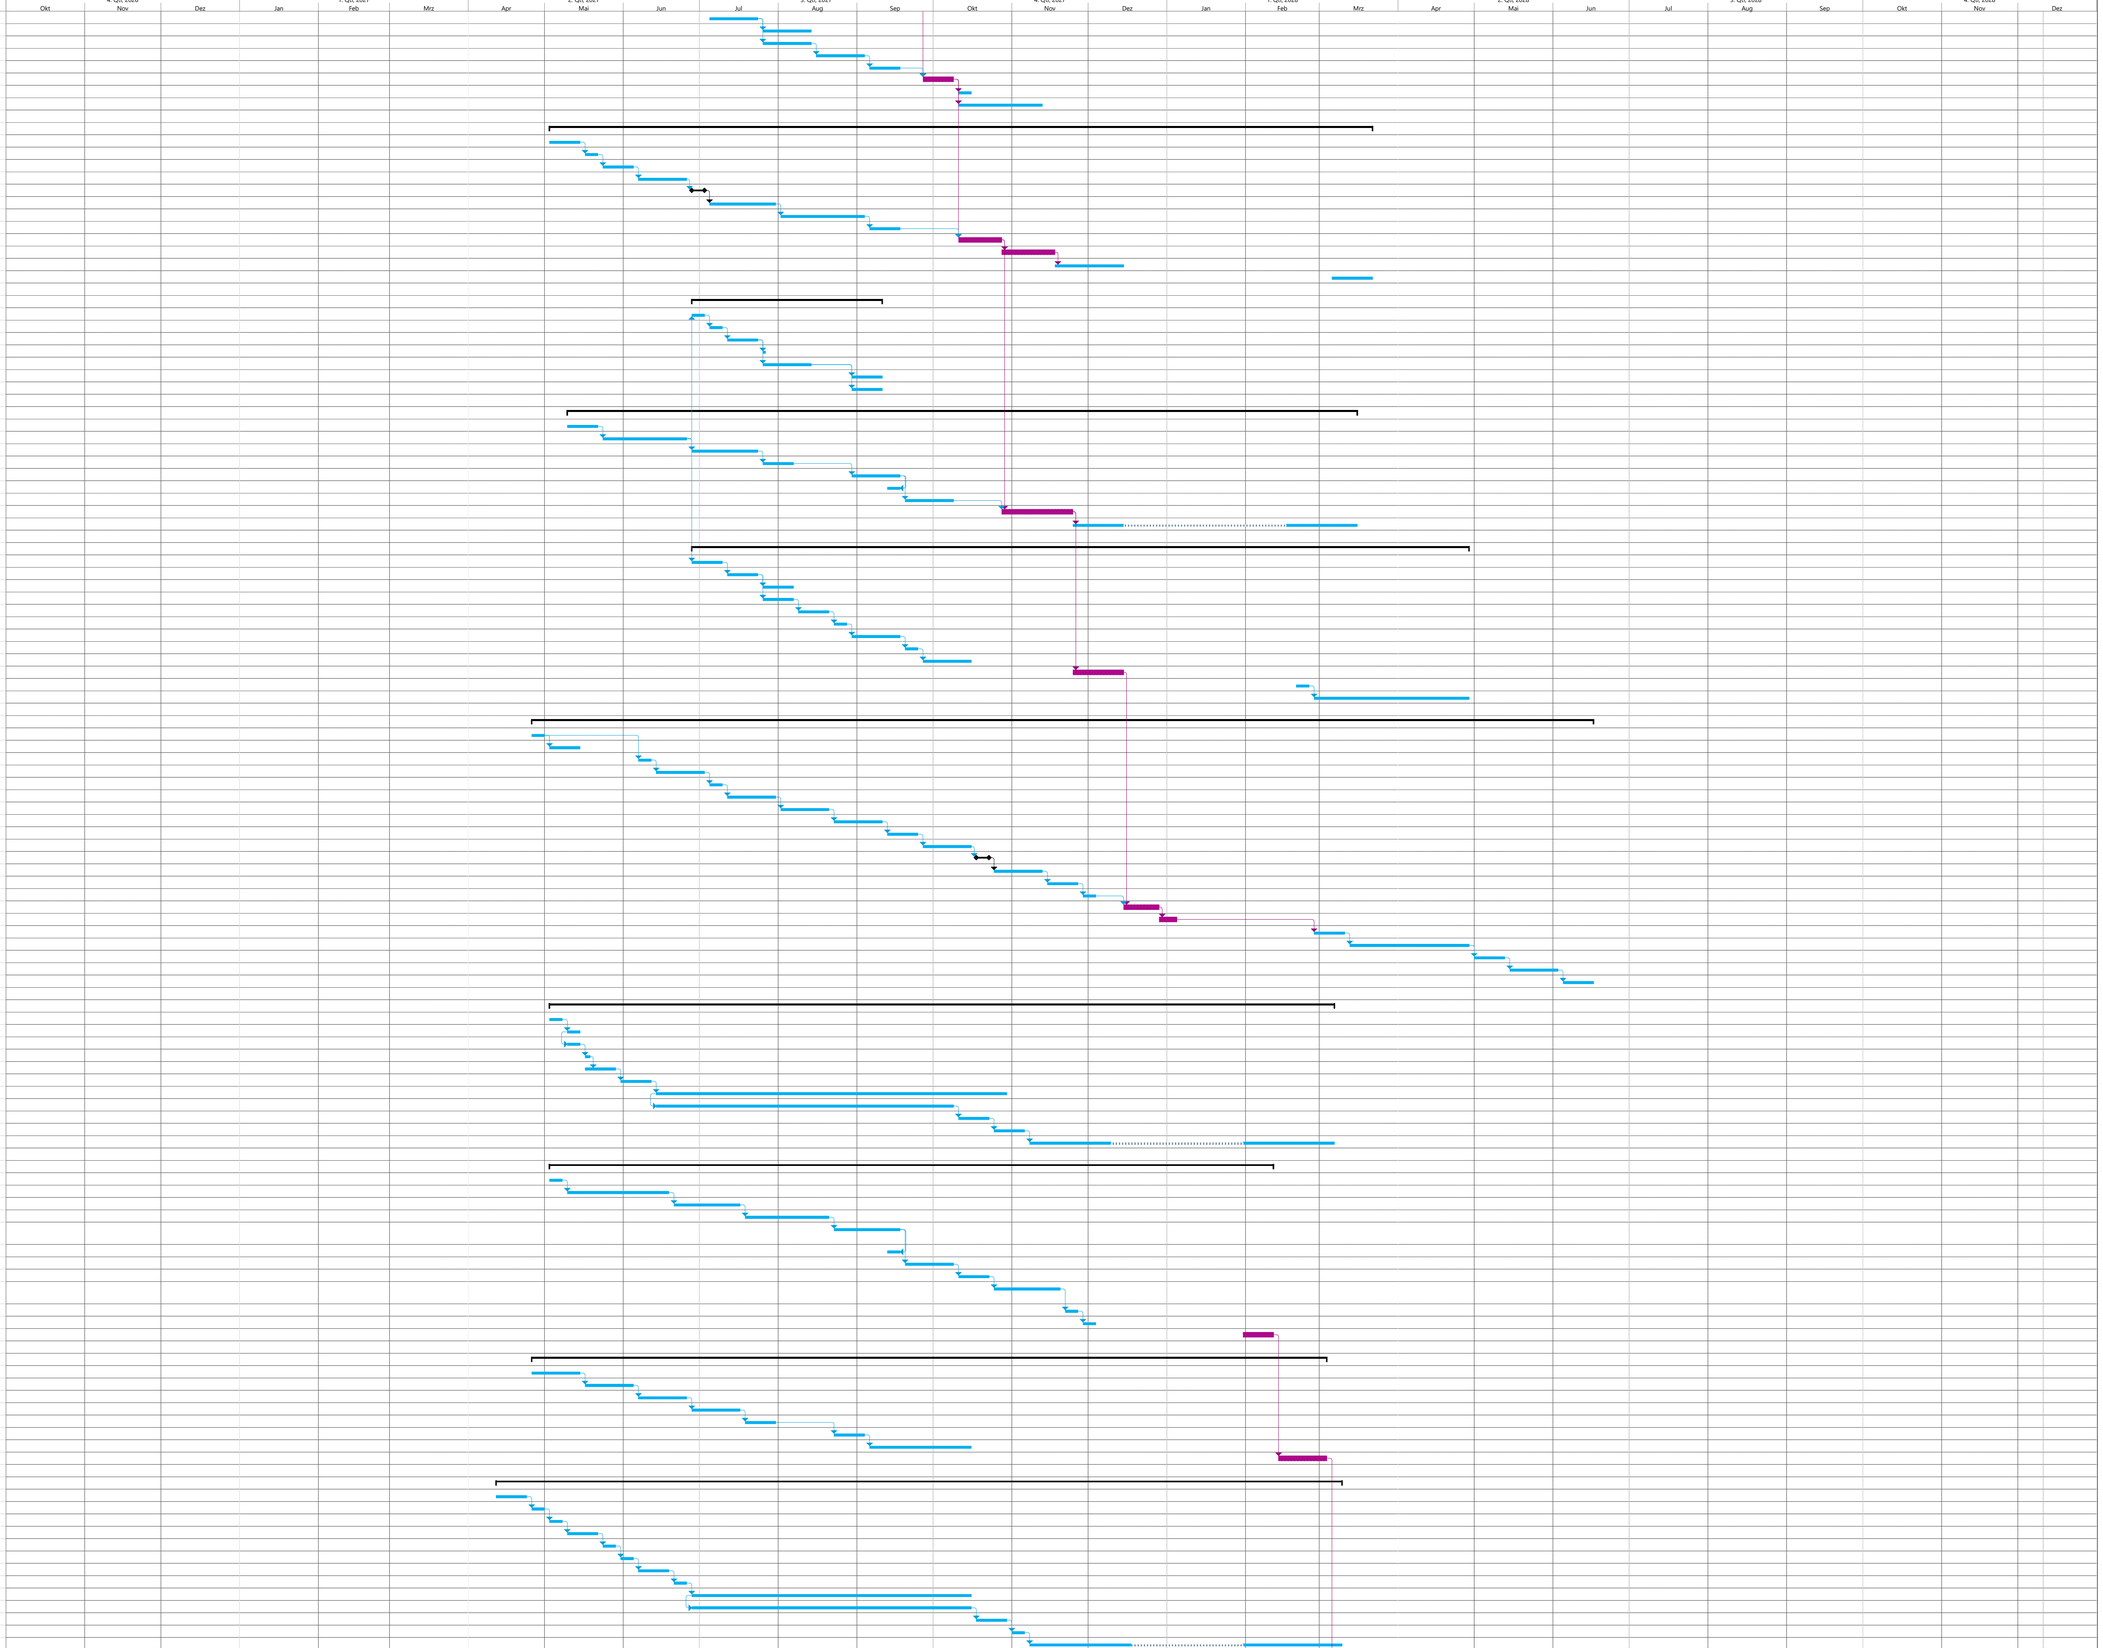

Projekt: 241127 Bauzeitenplan
Datum: Mon 28.07.25

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · Geplant · Geplanter Meilenstein · Geplanter Sammelvorgang · In Arbeit · Manueller Fortschritt

Anlage 11.2

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
263				
264	**BA 6.3 freie Strecke km 9+760 - 12+400 (ca. 2.650 m)**	**261 Tage**	**Mon 24.05.27**	**Fre 19.05.28**
265	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
266	Rückbau Gleis inkl. Schotter	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27
267	Kabeltiefbau -Querungen-	15 Tage	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27
268	Durchlasserneuerung	15 Tage	Mon 19.07.27	Fre 06.08.27
269	Überlastschüttung	40 Tage	Mon 09.08.27	Fre 01.10.27
270	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundamente	15 Tage	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27
271	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	10 Tage	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27
272	Kabeltiefbau Längsleitungen	20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27
273	Bahnsteigkanten-Fundament setzen	5 Tage	Mon 01.11.27	Fre 05.11.27
274	Zuwegung Erdarbeiten	5 Tage	Mon 08.11.27	Fre 12.11.27
275	Fahrbahn + P&R Erdarbeiten	5 Tage	Mon 15.11.27	Fre 19.11.27
276	Fahrbahn + P&R Pflasterarbeiten + Entwässerung	20 Tage	Mon 22.11.27	Don 16.12.27
277	Fahrbahn + P&R Asphalteinbau	5 Tage	Fre 17.12.27	Don 23.12.27
278	Böschungsaufbau und Sicherung bei Neufnachverschiebung mit Wegebau	25 Tage	Fre 14.01.28	Don 17.02.28
279	Gleisschottereinbau	10 Tage	Fre 18.02.28	Don 02.03.28
280	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	20 Tage	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28
281	Bahnsteigkanten setzen	5 Tage	Mon 20.03.28	Fre 24.03.28
282	Haltestellenausbau	40 Tage	Mon 27.03.28	Fre 19.05.28
283				
284	**BA 6.4 Neufnach-kor. km 12+300 - 12+400**	**15 Tage**	**Mon 24.01.28**	**Fre 11.02.28**
285	Oberbodenabtrag	3 Tage	Mon 24.01.28	Mit 26.01.28
286	Aushub Bachbett	3 Tage	Don 27.01.28	Mon 31.01.28
287	Aushub einbauen	3 Tage	Die 01.02.28	Don 03.02.28
288	Böschungsicherung einbauen	4 Tage	Fre 04.02.28	Mit 09.02.28
289	Oberboden einbauen	2 Tage	Don 10.02.28	Fre 11.02.28
290				
291	**BA 7.1 Langenn. Nord km 12+400 - 12+630 (ca. 250 m)**	**251 Tage**	**Mon 21.06.27**	**Fre 02.06.28**
292	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27
293	Rückbau Gleis inkl. Schotter	5 Tage	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27
294	Kabeltiefbau -Querungen-	10 Tage	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27
295	Durchlasserneuerung	5 Tage	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27
296	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundamente	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27
297	Fahrbahn prov. Asphalteinbau	5 Tage	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27
298	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	10 Tage	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27
299	Bahnsteigkanten-Fundament setzen	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27
300	Kabeltiefbau	20 Tage	Mon 20.09.27	Fre 15.10.27
301	Gleisschottereinbau	5 Tage	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27
302	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	5 Tage	Mon 03.04.28	Fre 07.04.28
303	Bahnsteigkanten setzen	5 Tage	Mon 10.04.28	Fre 14.04.28
304	Haltestellenausbau	35 Tage	Mon 17.04.28	Fre 02.06.28
305				
306	**BA 7.2 Langenn. Mitte km 12+630 - 13+170 (ca. 550 m)**	**161 Tage**	**Mon 06.09.27**	**Fre 14.04.28**
307	Baufeld freimachen, Entw.-gräben vorbereiten	5 Tage	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27
308	Rückbau Gleis inkl. Schotter	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27
309	Durchlasserneuerung	5 Tage	Mon 20.09.27	Fre 24.09.27
310	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	20 Tage	Mon 27.09.27	Fre 22.10.27
311	Kabeltiefbau	20 Tage	Mon 25.10.27	Fre 19.11.27
312	Gleisschottereinbau	5 Tage	Mon 22.11.27	Fre 26.11.27
313	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	5 Tage	Mon 10.04.28	Fre 14.04.28
314				
315	**BA 7.3 Langenn. Bf km 13+170 - 13+650 (ca. 500m)**	**216 Tage**	**Mon 30.08.27**	**Fre 23.06.28**
316	Baufeld freimachen	10 Tage	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27
317	Rückbau Gleis inkl. Schotter	15 Tage	Mon 13.09.27	Fre 01.10.27
318	Ausbau Bahnübergang, Kabeltiefbau+Fundam. 1 Stck	15 Tage	Mon 04.10.27	Fre 22.10.27
319	Fahrbahn prov. Asphalteinbau	5 Tage	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27
320	Aushub Bahnsteig	10 Tage	Mon 25.10.27	Fre 05.11.27
321	Kabeltiefbau	15 Tage	Mon 08.11.27	Fre 26.11.27
322	Kabeltiefbau und Entwässerungsquerungen	10 Tage	Mon 29.11.27	Fre 10.12.27
323	Bodenstabilisierung+Planum herstellen	20 Tage	Son 12.12.27	Die 08.02.28
324	Gründung für Oberleitungsmaste	5 Tage	Mit 09.02.28	Die 15.02.28
325	Tiefenentwässerung Längs	5 Tage	Mit 16.02.28	Die 22.02.28
326	Bahnsteigkanten-Fundament setzen	10 Tage	Mit 23.02.28	Die 07.03.28
327	Gleisschottereinbau	5 Tage	Mit 08.03.28	Die 14.03.28
328	Schwelleneinbau+Schieneneinbau	10 Tage	Mon 17.04.28	Fre 28.04.28
329	Weicheneinbau	5 Tage	Mon 01.05.28	Fre 05.05.28
330	Bahnsteigkanten setzen	10 Tage	Mon 01.05.28	Fre 12.05.28
331	Haltestellenausbau	30 Tage	Mon 15.05.28	Fre 23.06.28
332	Fahrbahn Erdarbeiten	15 Tage	Mit 15.03.28	Die 04.04.28
333	Fahrbahn Pflasterarbeiten + Entwässerung	20 Tage	Mit 05.04.28	Die 02.05.28
334	Fahrbahn Asphalteinbau	10 Tage	Mit 03.05.28	Die 16.05.28
335				
336	**Gleisbau -Bauabschnittsübergreifende Leistungen- Restarbeiten**	**95 Tage**	**Mon 17.07.28**	**Fre 24.11.28**
337	Stopfgänge+Gleisvermessung Ba 1 bis 5.2	10 Tage	Mon 17.07.28	Fre 28.07.28
338	Stopfgänge+Gleisvermessung Ba 5.3 und 7.3	5 Tage	Mon 31.07.28	Fre 04.08.28
339	Walzhautschliff Ba 1 bis 5.2	5 Tage	Mon 31.07.28	Fre 04.08.28
340	Walzhautschliff Ba 5.3 bis 7.3	5 Tage	Mon 07.08.28	Fre 11.08.28
341	Nacharbeiten und Feinprofillierung Graben	15 Tage	Mon 14.08.28	Fre 01.09.28
342	Gesamte Feldwege Wiederherstellen	15 Tage	Mon 06.11.28	Fre 24.11.28
343				
344	**Bü-Technik mit Stationsgebäude Ba 1 bis 7.3 (Phase 3 Tech. Gewerke)**	**155 Tage**	**Mon 28.02.28**	**Fre 29.09.28**
345	Stromanschlüsse Verrohrung herstellen	30 Tage	Mon 28.02.28	Fre 07.04.28
346	Kabelzug und Montage	20 Tage	Mon 10.04.28	Fre 05.05.28
347	Montage pro Bü 10 Tage+ 5 Tage HDF-Prüfung			
348	BÜ 1+097 B300, Ba 1	20 Tage	Mon 08.05.28	Fre 02.06.28
349	BÜ 2+904, Ba 2	40 Tage	Mon 08.05.28	Fre 30.06.28
350	BÜ 3+237, Ba 3	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
351	BÜ 4+045, Ba 4.1	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
352	BÜ 5+395, Ba 4.4	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
353	BÜ 7+524, Ba 5.1	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
354	BÜ 8+191, Ba 5.4	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
355	BÜ 8+413, Ba 5.4	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
356	BÜ 10+449, Ba 6.3	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
357	BÜ 10+963, Ba 6.3	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
358	BÜ 12+619 Weberstr., Ba 7.1	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
359	BÜ 13+217, Ba 7.3	45 Tage	Mon 08.05.28	Fre 07.07.28
360	LST Einbau mit Verkabelung Ba 1 bis Ba 7.3	80 Tage	Mon 12.06.28	Fre 29.09.28
361	Anbindung Gleiselemente (BÜ, Weichen, Tore, Signale) an Streckenkabel	80 Tage	Mon 12.06.28	Fre 29.09.28
362	DSTW und GFK	50 Tage	Mon 10.07.28	Fre 15.09.28
363				
364	**Oberleitungbau Ba 1 bis 7.3**	**100 Tage**	**Mon 01.05.28**	**Fre 15.09.28**
365	Montage OLA-Masten	65 Tage	Mon 01.05.28	Fre 28.07.28
366	Montage Ausleger + UG + RLS	50 Tage	Mon 22.05.28	Fre 28.07.28
367	Fahrdrahtmontage & Mastschalter	65 Tage	Mon 22.05.28	Fre 18.08.28
368	Fahrdrahtmontage ausrichten Nebenarbeiten	30 Tage	Mon 07.08.28	Fre 15.09.28
369				
370	**Haltestellenausstattung einbauen und Fertigstellen**	**45 Tage?**	**Mon 04.09.28**	**Fre 03.11.28**
371	FGU Montieren	15 Tage	Mon 04.09.28	Fre 22.09.28
372	Beleuchtung	15 Tage?	Mon 04.09.28	Fre 22.09.28
373	DFI Montage	10 Tage?	Mon 25.09.28	Fre 06.10.28
374	Ausstattung einbauen	10 Tage?	Mon 25.09.28	Fre 06.10.28
375	Beläge fertigstellen	20 Tage?	Mon 09.10.28	Fre 03.11.28
376				
377	**Inbetriebnahmephase (Phase 4)**	**55 Tage**	**Mon 25.09.28**	**Son 10.12.28**
378	Prüfen und Abnahme BÜ	30 Tage	Mon 25.09.28	Fre 03.11.28
379	Prüfen und Abnahme LST- Technik	30 Tage	Mon 25.09.28	Fre 03.11.28
380	Abnahme und Schaltprüfungen Oberleitung	30 Tage	Mon 25.09.28	Fre 03.11.28
381	Test- und Schulungsfahrten	20 Tage	Mon 06.11.28	Fre 01.12.28
382	**Eröffnung und Inbetriebnahme der rektivierten Staudenbahn**	0 Tage	Son 10.12.28	Son 10.12.28
383				
384				
385	**Aufgestellt:**			
386	**Mindelheim dem 28.07.2025**			
387	**Johann Karmann**			

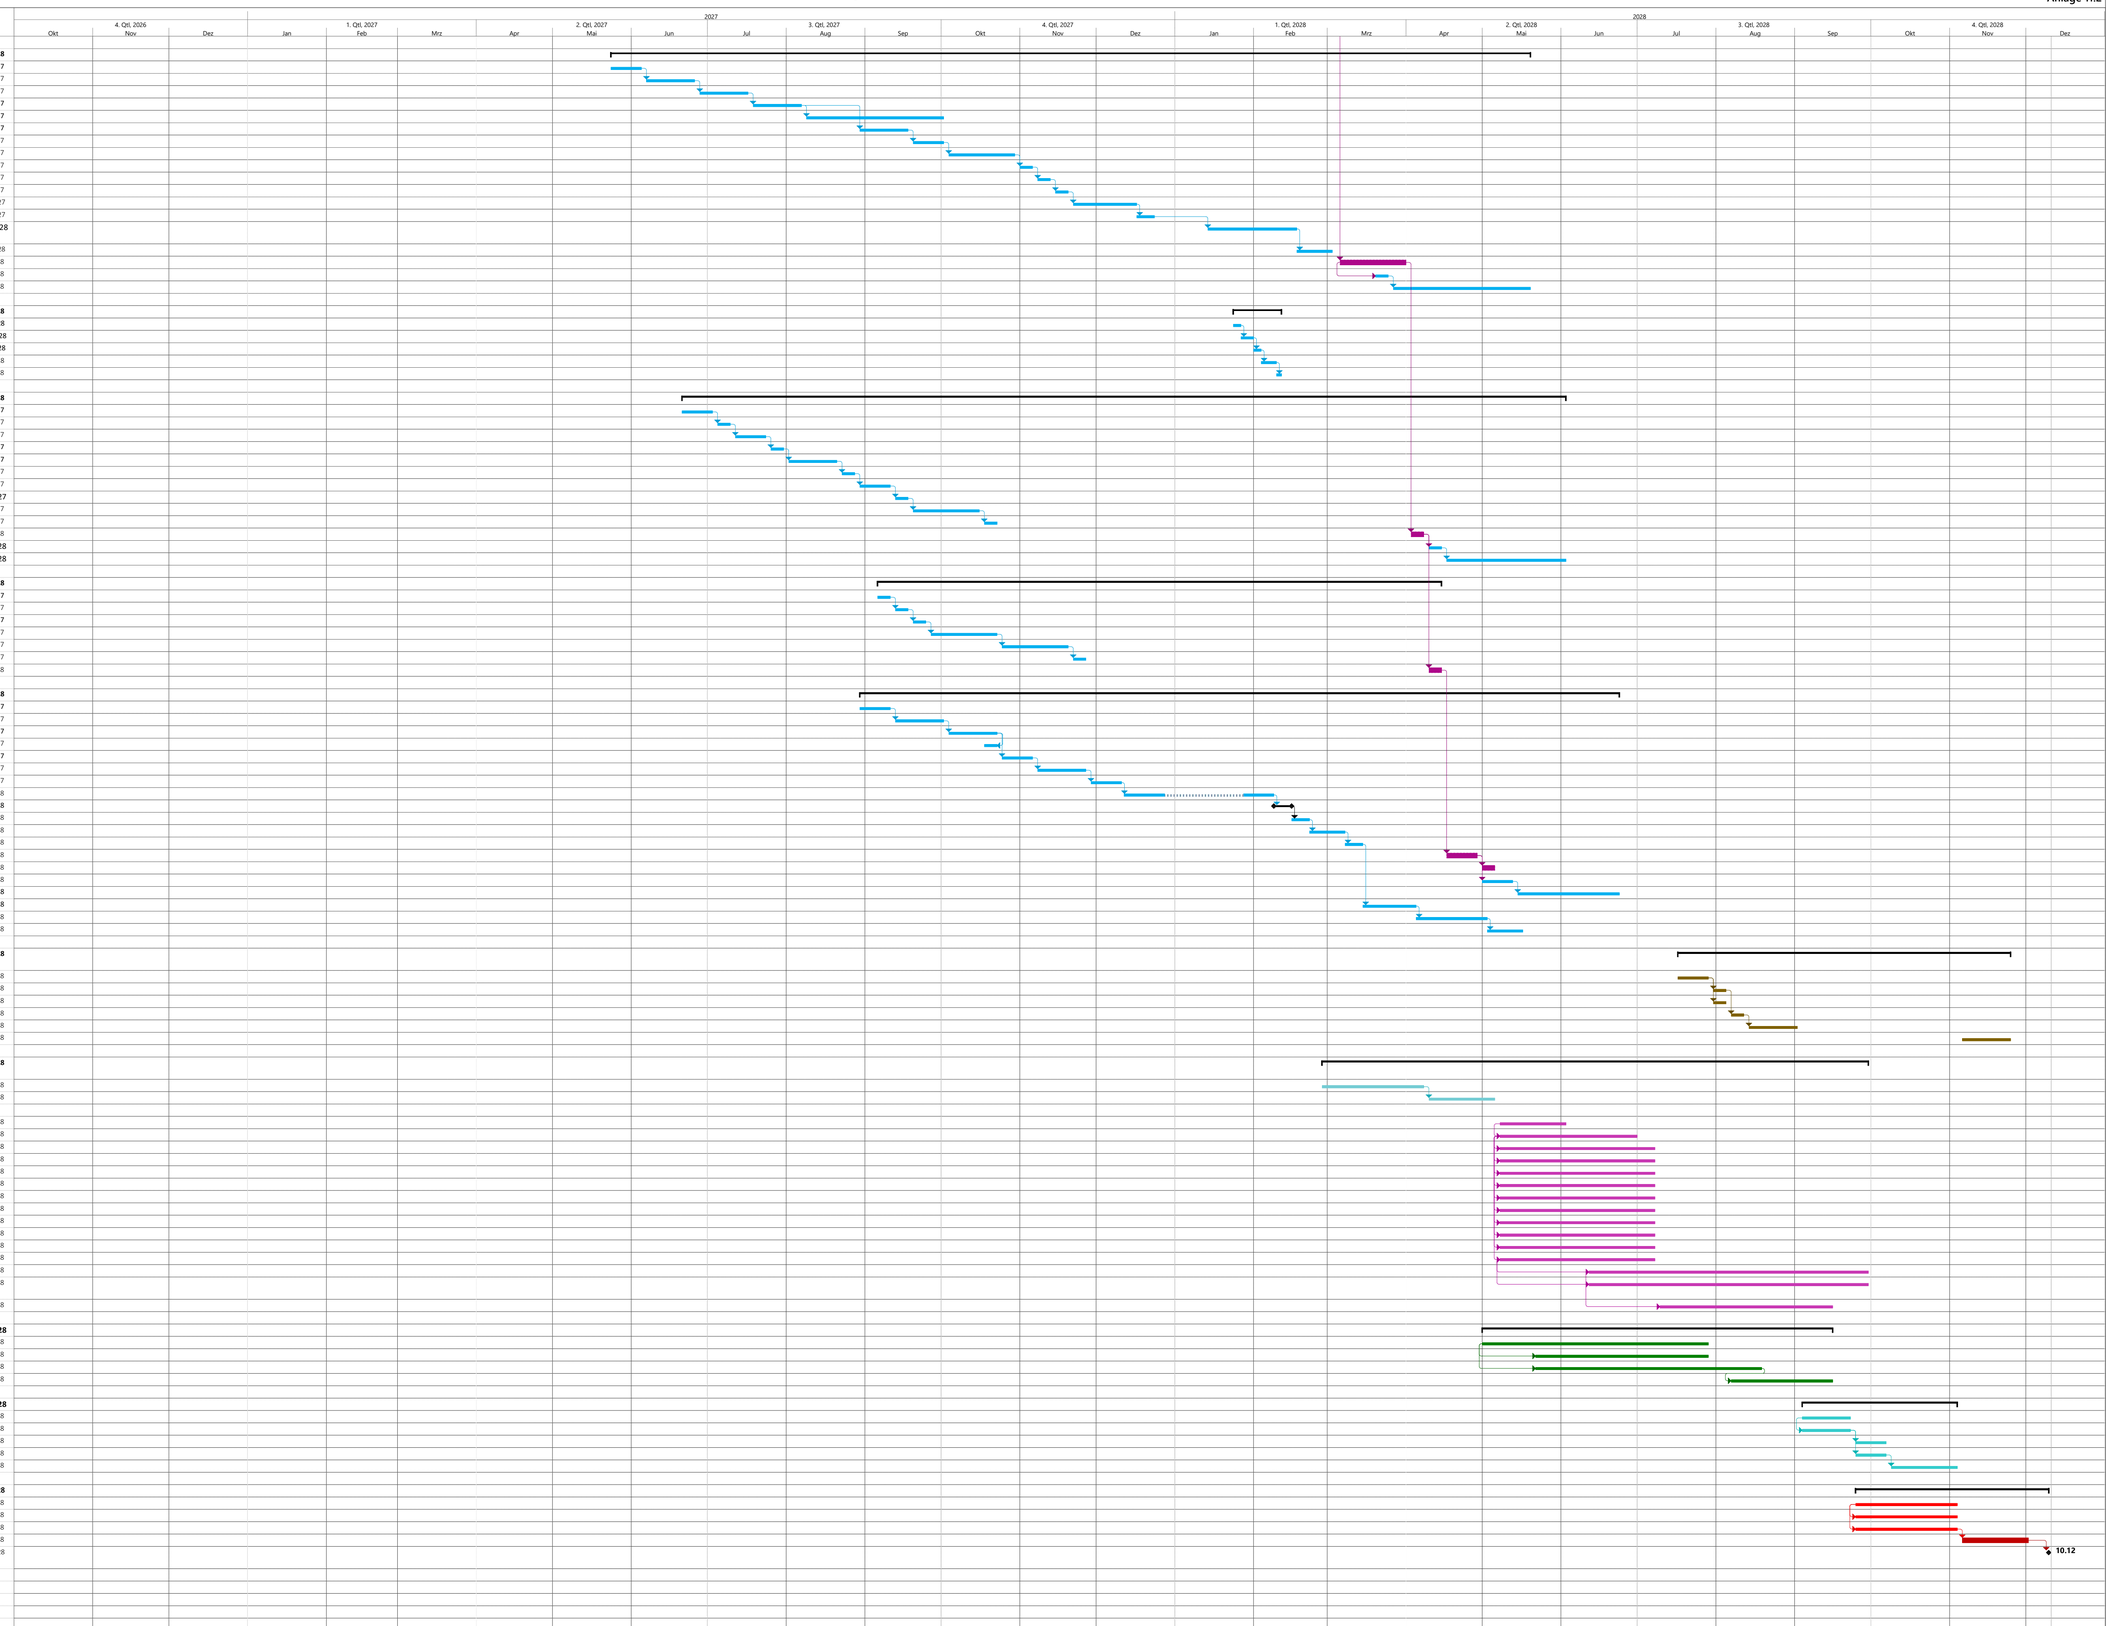

Projekt: 241127 Bauzeitenplan
Datum: Mon 28.07.25

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | Geplant | Geplanter Meilenstein | Geplanter Sammelvorgang | In Arbeit | Manueller Fortschritt
